



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА


«МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ ШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА»

Начальник отдела образования администрации
Красненского района

Доманова Наталья Павловна


Красное, 2018 год

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

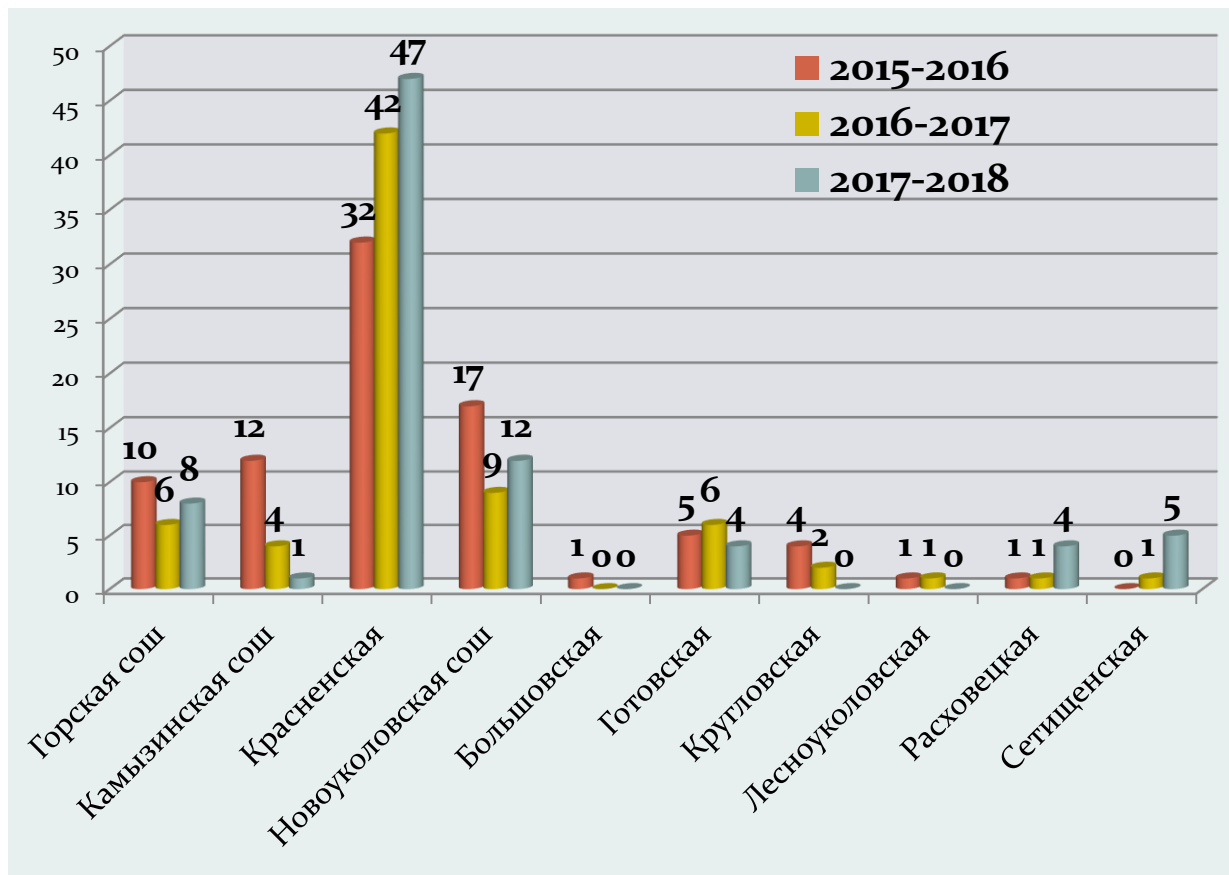

Рейтинг ОО по показателю
«Победители и призеры
муниципального этапа ВсОШ»

Доля победителей и
призеров регионального
этапа



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

ПРОБЛЕМЫ:

Не отработана муниципальная система диагностических процедур и методов по выявлению одарённых детей

1.

Требует совершенствования система повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми

2.

Недостаточный уровень базовой подготовки учеников по предметам. Низкий уровень мотивации учеников к саморазвитию

3.

4.

Низкий уровень осведомленности родителей о муниципальной системе подготовки школьников к предметным олимпиадам

5.

Недостаточный уровень взаимодействия с членами региональных предметно-методических комиссий

6.

Низкий уровень мотивации учителей к профессиональному самосовершенствованию

Цель и результат проекта

Цель проекта:	Увеличение количества победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, показавших результативное участие с 60 до 100 человек на муниципальном уровне и с 2 до 6 человек на региональном уровне к 31 марта 2021 года
Способ достижения:	Совершенствование муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам и педагогов, осуществляющих подготовку учеников к предметным олимпиадам муниципального, регионального уровней
Результат проекта:	Совершенствованная муниципальная система непрерывной подготовки к олимпиадам обучающихся и педагогов, позволяющей увеличить количество победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в три раза (на 10-15 человек в год на муниципальном уровне, на 1-2 человек в год на региональном уровне) к 31 марта 2021 года
Требования к результату:	<ul style="list-style-type: none">-Внесены изменения в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;-созданы не менее 15 команд учителей (более 40 педагогов);- созданы не менее 15 команд школьников по предметам (более 200 обучающихся 4-11 классов);- организовано повышение профессионального уровня педагогов по 15 предметам на базе ОГАОУ ДПО «БелиРО»;-организована подготовка жюри муниципальногоэтапа не менее, чем по 15 предметам;- создана муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках;- Организовано участие в проведении не менее 6 однодневных сессий в год по 6 блокам предметов:<ul style="list-style-type: none">1 блок – физика, математика, астрономия;2 блок – математика, информатика;3 блок – химия, биология, география;4 блок – история, обществознание, право, экономика;5 блок – русский язык, литература;6 блок – иностранные языки- обеспечено 100% прохождение обучающимися 6 однодневных сессий
Пользователи результата:	Обучающиеся, родители, педагогические работники Красненского района

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

Непрерывная система подготовки:

ШКОЛЬНИКОВ к олимпиадам

педагогов, осуществляющих подготовку учеников к предметным олимпиадам муниципального и регионального уровней



1.

ПОДГОТОВКА:

- **УЧАЩИХСЯ** (на школьном, муниципальном и региональном уровнях)
- **ПЕДАГОГОВ** в рамках районных семинаров, на базе ВУЗов; ДПО «БелиРО»

2.


СОПРОВОЖДЕНИЕ:

УЧАЩИХСЯ в муниципальном, региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников

3.

МОТИВАЦИЯ:

- **УЧАЩИХСЯ:** материальное поощрение; льготы при поступлении в вуз;
- **ПЕДАГОГОВ:** материальное поощрение, льготы при аттестации



- мониторинг результатов учеников в школьных олимпиадах;
- формирование реестра одаренных детей;

- организация занятий со школьниками на базе школы

- самообразование,
- участие в школьных МО;
- участие в обучающих семинарах в рамках РМО ,



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

УЧАЩИЕСЯ

ПЕДАГОГИ

- формирование команд учащихся (4-11 классов);
- проведение занятий на базе опорной школы (не менее 5 раз по 6 блокам предметов в год);
- участие в региональных летних образовательных сессиях, профильных школах, учебно-тренировочных сборах

**15 команд школьников в каждом
(более 200 учащихся 4-11 классов)**

- создание Банка педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад;
- формирование команд педагогов;
- повышение квалификации педагогов (в рамках районных проблемных семинаров и методических объединений).

**15 команд учителей
более 40 человек)**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

УЧАЩИЕСЯ

ПЕДАГОГИ

- формирование команд обучающихся (7-11 классов);
- дистанционное взаимодействие педагогов с обучающимися;
- организация работы региональных летних образовательных сессий. профильных школ, учебно-тренировочных сборов

- создание Банка педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад;
- формирование команд педагогов;
- повышение квалификации педагогов (курсы БелИРО)



УЧЕНИКИ

ПЕДАГОГИ



Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Участие в региональных конкурсах

Участие в вузовских предметных олимпиадах

Участие в конкурсах муниципального уровня

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Участие в школьном этапе олимпиады

Проведение конкурсов на школьном уровне

Участие в школьном этапе олимпиады

освещение мероприятий на сайте отдела образования, в СМИ; проведение родительских собраний,

МОТИВАЦИЯ

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»



Дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в ВУЗы региона

Учреждение Грантов для победителей и призеров регионального этапа олимпиады

Материальное поощрение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады

ПЕДАГОГИ

Учреждение премий педагогам, подготовившим победителей и призеров регионального этапа олимпиады



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Блок «Выявление»	702	01.03.2018	20.12.2020												
1.1	Создание команд учителей в Красненском районе для подготовки школьников к олимпиадам по предметам	20	01.03.2018	31.03.2018												
1.2	Создание команд школьников по предметам, показывающих высокие результаты	20	01.03.2018	31.03.2018												
1.3	Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках	20	01.03.2018	31.03.2018												
1.4	Отбор и согласование обучающихся для участия в областных образовательных сессиях 2018-2019 учебного года по предметам	227	01.08.2018	21.06.2019												
1.5	Отбор и согласование обучающихся для участия в образовательных сессиях 2019-2020 учебного года по предметам	227	01.08.2019	19.06.2020												
1.6	Отбор и согласование обучающихся для участия в образовательных сессиях 2020-2021 учебного года по предметам	101	01.08.2020	18.12.2020												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.7	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2018-2019 учебного года	25	16.07.2018	17.08.2018												
1.8	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2019-2020 учебного года	25	15.07.2019	16.08.2019												
1.9	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2020-2021 года	25	15.07.2020	17.08.2020												
1.10	Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам естественно-математического цикла для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	01.07.2018												
1.11	Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам гуманитарного цикла для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	01.07.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.12	Формирование списка членов предметных методических комиссий по физической культуре, ОБЖ, технологии для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	01.07.2018												
2	Блок «Подготовка учащихся»	601	01.08.2018	20.12.2020												
2.1.	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2018 года	28	01.08.2018	10.09.2018												
2.2	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2019 года	29	01.08.2019	10.09.2019												
2.3	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2020 года	29	03.08.2020	10.09.2020												
2.4	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	544	20.08.2018	20.10.2020												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2.4.1	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году	23	20.08.2018	19.09.2018												
2.4.2	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году	25	19.08.2019	20.09.2019												
2.4.3	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году	24	18.08.2020	18.09.2020												
2.4.4	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году	15	01.10.2018	19.10.2018												
2.4.5	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году	15	02.10.2019	20.10.2019												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год					
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
2.4.6	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году	14	01.10.2020	20.10.2020														
2.5	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах	576	02.09.2018	20.12.2020														
2.5.1	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2018 года)	79	02.09.2018	18.12.2018														
2.5.2	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (в I полугодии 2019 года)	80	11.03.2019	28.06.2019														
2.5.3	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2019 года)	78	02.09.2019	18.12.2019														
2.5.4	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (в I полугодии 2020 года)	78	11.03.2020	29.06.2020														

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

КОД	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2.5.5	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2020 года)	78	02.09.2020	18.12.2020												
3	Блок «Подготовка педагогов»	601	01.08.2018	20.12.2020												
3.1	Подготовка председателей предметных жюри и предметных комиссий муниципального этапа олимпиады	601	01.08.2018	20.12.2020												
3.1.1	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2018 году	18	01.08.2018	24.08.2018												
3.1.2	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2018 году	18	01.08.2018	24.08.2018												
3.1.3	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2018 году	18	01.08.2018	24.08.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.1.4	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019												
3.1.5	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019												
3.1.6	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019												
3.1.7	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020												
3.1.8	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.1.9	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020												
3.2	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий	499	03.09.2018	03.09.2020												
3.2.1	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий на 2018-2019 учебный год	14	03.09.2018	20.09.2018												
3.2.2	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий 2019-2020 учебный год	14	03.09.2019	20.09.2019												
3.2.3	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий 2020-2021 учебный год	12	03.09.2020	18.09.2020												
3.3	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри	499	03.09.2018	03.09.2020												
3.3.1	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2018-2019 учебный год	14	03.09.2018	20.09.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.3.2	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2019-2020 учебный год	14	03.09.2019	20.09.2019												
3.3.3	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2020-2021 учебный год	12	03.09.2020	18.09.2020												
3.4	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2018 году	99	01.08.2018	20.12.2018												
3.5	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2019 году	241	09.01.2019	20.12.2019												
3.6	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2020 году	241	09.01.2020	20.12.2020												
3.7	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2018 году «Подари успех»	34	02.04.2018	18.05.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.8	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2019 году «Подари успех»	34	01.04.2019	20.05.2019												
3.9	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2020 году «Подари успех»	34	01.04.2020	20.05.2020												
4	Сопровождение	621	01.10.2018	31.03.2021												
4.1	Организация и проведение школьного этапа олимпиады	500	01.10.2018	31.10.2020												
4.1.1	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018												
4.1.2	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018												
4.1.3	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.1.4	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2019 году	23	01.10.2019	31.10.2019												
4.1.5	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2019 году	23	01.10.2019	31.10.2019												
4.1.6	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2019 году	23	01.10.2019	31.10.2019												
4.1.7	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020												
4.1.8	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020												
4.1.9	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.2	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады	538	01.11.2018	25.12.2020												
4.2.1	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018												
4.2.2	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018												
4.2.3	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018												
4.2.4	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019												
4.2.5	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.2.6	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019												
4.2.7	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020												
4.2.8	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020												
4.2.8	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020												
4.3	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2019 году	54	11.01.2019	28.03.2019												
4.4	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2020 году	52	14.01.2020	27.03.2020												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.5	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2021 году	54	13.01.2021	31.03.2021												
5	Информационное сопровождение	621	19.10.2018	31.03.2021												
5.1	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2018 году	9	19.10.2018	31.10.2018												
5.2	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2019 году	9	21.10.2019	31.10.2019												
5.3	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2020 году	9	20.10.2020	30.10.2020												
5.4	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в 2018 году	6	20.12.2018	27.12.2018												
5.5	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в 2019 году	6	20.12.2019	27.12.2019												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5.6	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в 2020 году	6	21.12.2020	28.12.2020												
5.7	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2018 году	9	20.03.2018	30.03.2018												
5.8	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2019 году	8	20.03.2019	29.03.2019												
5.9	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2020 году	8	20.03.2020	31.03.2020												
5.10	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2021 году	8	22.03.2021	31.03.2021												
6	Мотивация	767	01.03.2018	31.03.2021												
6.1	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года	20	1.03.2018	30.03.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

код	Наименование	Длит. дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
6.2	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года	20	01.03.2019	29.03.2019												
6.3	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года	21	02.03.2020	31.03.2020												
6.4	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года	22	01.03.2021	31.03.2021												
6.5	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2017-2018 году	20	1.03.2018	31.03.2018												
6.6	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году	20	01.03.2019	30.03.2019												
6.7	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году	21	01.03.2020	31.03.2020												
6.8	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году	22	01.03.2021	31.03.2021												
ИТОГО		767	01.03.2018	31.03.2021												

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Код	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования	
			федеральный бюджет	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства
1	Блок «Выявление»	0	0	0	0	0	0
2	Блок «Подготовка учащихся»	0	0	0	0	0	0
3	Блок «Подготовка педагогов»	0	0	0	0	0	0
4	Сопровождение	90,0	0	0	90,0	0	0
5	Информационное сопровождение	0	0	0	0	0	0
6	Мотивация	140,0	0	0	140,0	0	0
ИТОГО		230,0	0	0	230,0	0	0

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<i>Бюджетное финансирование</i>				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	<i>«Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»</i>	0,0	0,0	230,0
Дороги*		0,0	0,0	0,0
Субсидии*		0,0	0,0	0,0
ИТОГО:		0,0	0,0	230,0
<i>Участие в программах государственной поддержки</i>				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*			0,0	
Газоснабжение*			0,0	
Водоснабжение*			0,0	
Гарантии*			0,0	
Залоги*			0,0	
Прочие формы участия*:			0,0	
Земельный участок: -				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	1,5
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	

КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте
1	Николаева Анна Ивановна, заместитель главы администрации муниципального района - председатель комитета по социальной политике	Проектный специалист 4 класс	Куратор
2	Доманова Наталья Павловна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта Член рабочей группы проекта (Р)
3	Тищенко Елена Валентиновна, старший методист МЦОКО		Администратор проекта Член рабочей группы проекта (Р)
4	Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ ДО «Дом детского творчества»		Оператор мониторинга, член рабочей группы
5	Закурдаева Ольга Борисовна, главный специалист отдела образования	Проектный специалист 4 класс	Член рабочей группы проекта (Р)
6	Веретенникова Ирина Васильевна, заведующий МЦОКО		Член рабочей группы проекта (Р)
7	Жданова Элеонора Александровна, методист МЦОКО		Член рабочей группы проекта(Р)
8	Ушакова Ирина Валерьевна, методист МЦОКО		Член рабочей группы проекта (Р)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

руководитель проекта

Доманова Наталья Павловна

администратор проекта:

Тищенко Елена Валентиновна

8(47262) 5-25-91



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ ШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА»

Начальник отдела образования администрации
Красненского района

Доманова Наталья Павловна

Красное, 2018 год
